



# भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तूलसीपूर दाड



## वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी

आ.व. ०७७१७८

प्रस्तूतकर्ता

कृष्ण प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत



# भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ



- साविकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय स्थापना: २०३८
- भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना: २०७५ भाद्र
- यस कार्यालयले ६ जिल्लामा एकिकृत जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न कार्य गर्छ ।



## कार्यालयको लक्ष्य :

एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनद्वारा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन तथा समुन्नतिको लागि टेवा पुर्याउने ।

## कार्यालयको उद्देश्य :

- कार्यक्षेत्र अन्तरगतका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्बर्धन गरी बाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्‍याउने ।
- जलाधारक्षेत्रहरुको बैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू-क्षय कम गरी जमिनको उर्बराशक्ति कायम राख्नुको साथै बिकासको पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने ।

**भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, दाङको  
कार्यक्षेत्र अन्तरगतका जिल्लाहरू**



**लुम्बिनी प्रदेश**


# जलाधार / उपजलाधार संख्या

	दाङ्ग	बाके	वर्दिया	प्युठान	रोल्पा	रुकुम पूर्व	जम्मा
जलाधार संख्या	७	७	७	७	६	३	३७
उपजलाधार संख्या	७३	३१	२८	३३	४७	२७	२३९

# कार्यालयसंग सम्बन्धित मुख्य समस्याहरु/ स्थानीय मागहरु

	दाङ्ग	बाके	वर्दिया	प्युठान	रोल्पा	रुकुम पूर्व
मुख्य समस्याह रु/ स्थानीय मागहरु	<ul style="list-style-type: none"> <li>नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>गल्छी, खहरे नियन्त्रण</li> <li>पोखरी, पानी मुहान, सिमसार संरक्षण</li> <li>ग्रामीण सडक संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>गल्छी, खहरे नियन्त्रण</li> <li>पोखरी, सिमसार संरक्षण</li> <li>ग्रामीण सडक संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>खहरे नियन्त्रण</li> <li>नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>पोखरी सिमसार संरक्षण</li> <li>ग्रामीण सडक संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहिरो, गल्छी नियन्त्रण</li> <li>नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>पोखरी, पानी मुहान संरक्षण</li> <li>स्कूल संरक्षण</li> <li>ग्रामीण सडक संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>पहिरो, गल्छी, गल्छी नियन्त्रण</li> <li>पोखरी, पानी मुहान संरक्षण</li> <li>ग्रामिण सडक संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहिरो, गल्छी नदी कटान नियन्त्रण</li> <li>पोखरी, पानी मुहान संरक्षण</li> <li>स्कूल संरक्षण</li> <li>आकस्मिक ग्रामिण सडक संरक्षण</li> <li>साना जलविद्युत जलाधार संरक्षण</li> <li>आकस्मिक भू संरक्षण</li> </ul>

# कार्यालयको सांगठनिक संरचना

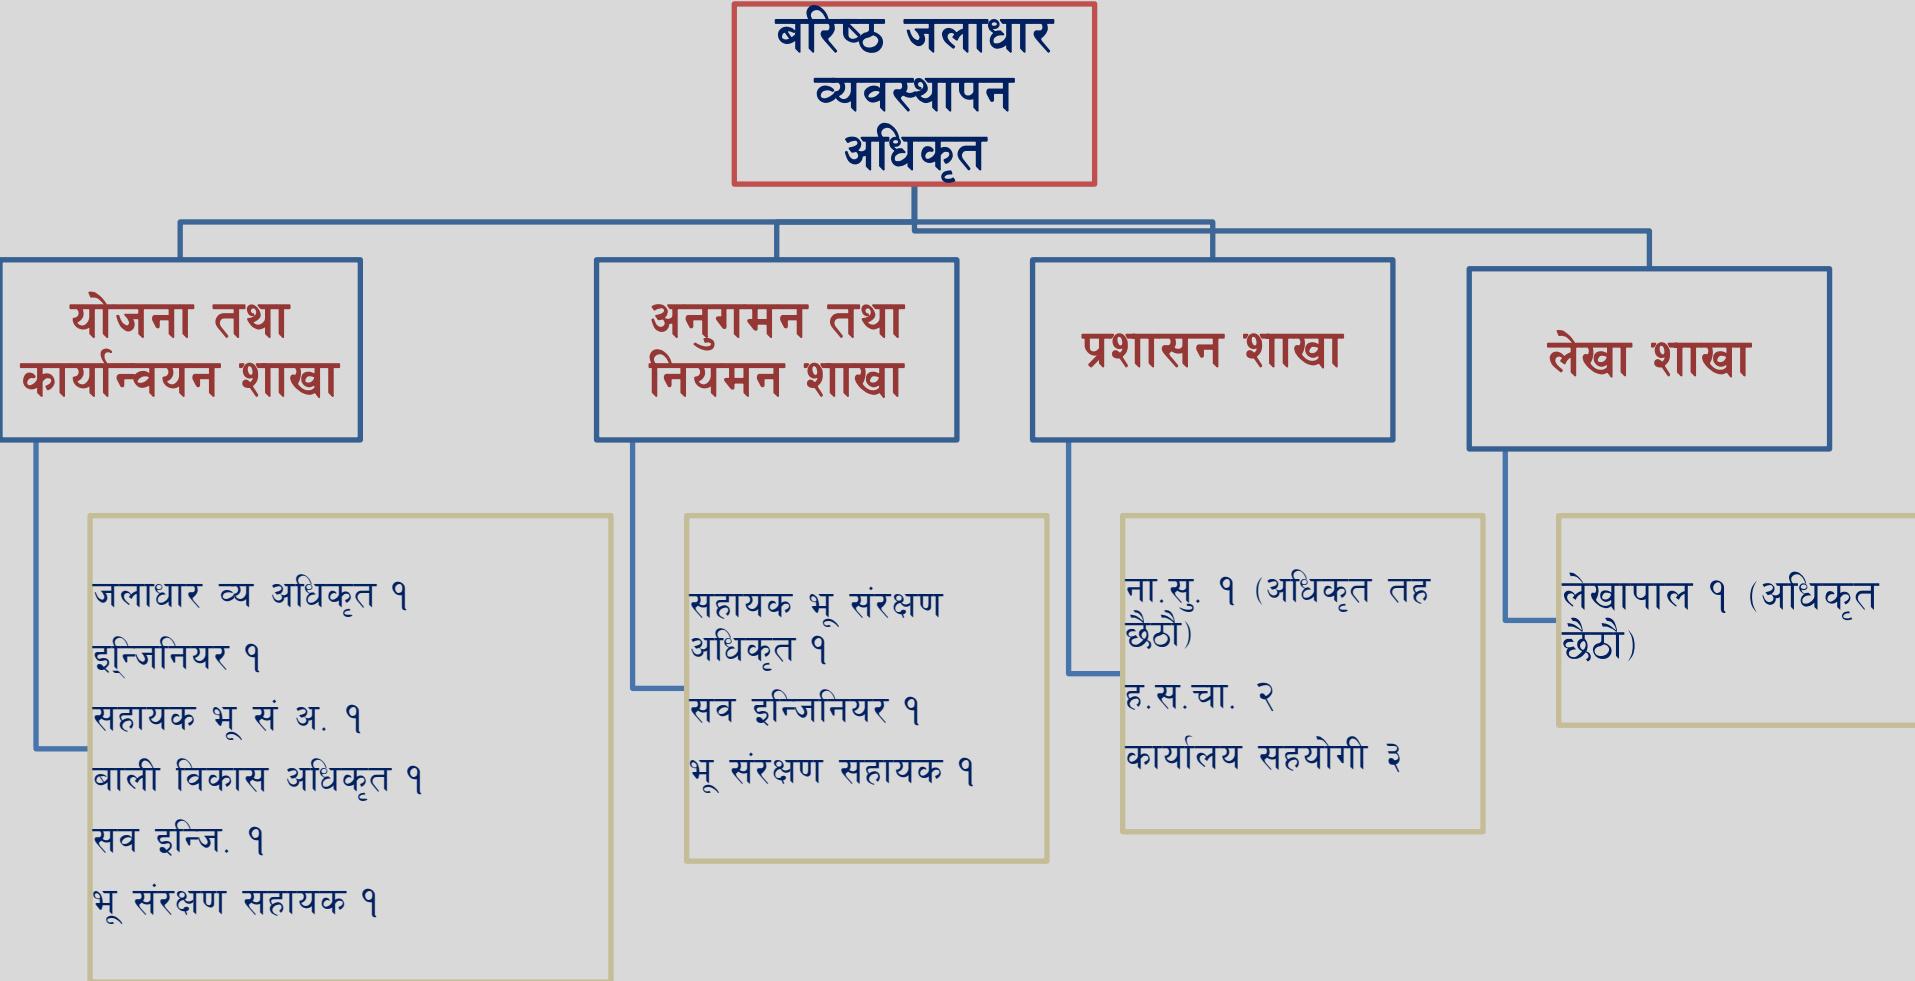

# दरबन्दी र पदपुर्तिको अवस्था

सि. नं.	पद	सेवा	समुह	श्रेणी । तह	कुल दरबन्दी संख्या	पदपुर्ति संख्या		रिक्त
						स्थायी	करार	
१	वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत	नेपाल वन	स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन	अधिकतस्तर दशौं	१	१		
२	सहायक भु संरक्षण अधिकृत	नेपाल वन	स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन	अधिकतस्तर आठौं । सातौं	३	२		१
३	इन्जिनियर	इन्जिनियरिंग	सिभिल । इरिगेसन	अधिकतस्तर आठौं । सातौं	१			१
४	बाली विकास अधिकृत	कृषि	एग्रेनोमी	अधिकतस्तर आठौं । सातौं	१			१
५	लेखापाल	प्रशासन	लेखा	अधिकतस्तर छैठौं	१	१		
६	नायब सूब्बा	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	अधिकतस्तर छैठौं	१	१		
७	भु संरक्षण सहायक	नेपाल वन	स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन	सहायकस्तर पाचौं	२	१		१
८	सब इन्जिनियर	इन्जिनियरिंग	सिभिल । इरिगेसन	सहायकस्तर पाचौं	२			२
९	हलुका सवारी चालक	प्रशासन	सामान्य प्रशासन		२		२	
१०	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन	सामान्य प्रशासन		३	२	१	

# बार्षिक बजेट विनियोजन (रकम रु लाखमा)

सि.नं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रम	बजेट
१	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३३ चालु	तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन	१०४।०७
२	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३४ पुँजिगत	फर्निचर, सवारी साधन, मेशिन औजार खरीद, मर्मत	५।५
३	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५३ चालु (कार्यक्रम)	गोष्ठी, प्रचार प्रसार, Activity profile तयारी	७।५
४	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५४ पुँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम(प्रदेश सरकार)	१०५२
५	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०३ चालु (कार्यक्रम)	फलफूल रोपण (संघिय सशर्त)	८
६	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०४ पुँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन (संघिय सशर्त)	१६३
	जम्मा		१३४०।०७

# चालु आ.व.मा प्रदेश सरकार तर्फको जिल्लागत कार्यक्रम बजेट (रकम रु लाखमा)

सि. नं.	कृयाकलाप विवरण	इकाई	जिल्ला												कुल जम्मा	
			दाङ		प्युठान		बाँके		बर्दिया		रोल्पा		रूकुम पुर्व			
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट
१	आकस्मिक पहिरो तथा नदि खोला व्यवस्थापन	वटा	१	२०१०	१	२०१	१	२०१	१	२०१०	१	२०१०	१	२०१०	६	१२०१००
२	गल्छि पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण	वटा	५	६६२०	४	४०१	२	२०१	२	२०१०	४	५११६	४	२०	२१	२२०१००
३	पानी मुहान संरक्षण पोखरी निर्माण	वटा	३	१५१०	१	५१०	२	१०१	२	१०१०	१	५१००	१	५१०	१०	५०१००
४	३ वटा उपजलाधार प्रथमिकिकरण तथा २ वटा उपजलाधार योजना निर्माण	वटा/प्याकेज	१	१५१०												१५१००
५	नदि तथा खोला किनार व्यवस्थापन	कि.मी	२१६६	१४३१०	०१४०	२०१	११४०	७०१	११२०	६०१०	०१४	२०१०	०१२	१०१०	४१४६	३२३१००
६	संवेदनशिल शहरी जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन	क्षेत्रफल स्थान	२१६०	३५१०	२१६०	३५१०	२१६०	३५१०	२१६०	३५१०	२१६	३५१०	१	१२१५	१५	१६७५०
७	ग्रामीण सडक सग भू संरक्षण	कि.मी	०१२३	१०१०	०१७२	३०१	०१२३	१०१	०१२३	१०१०	०१७२	३०१०	०१३७	१५१०	२१५	१०५१००
८	फलफुल डाले घास रोपन	हेक्टर	१३३३३	६१०	१११११	५१०	१३३३३	६१०	१३३३३	६१००	११११	५१००	७१७९	३५१०	७०	३१५१०
९	प्रचारप्रसार ,गोष्ठी,Activity profile तयारी		११००	७५												
	<b>जम्मा</b>			३१९१७		१५५		१७१		१६१		१६६१६		६६		१०५९१५

# संघिय सरकार सशर्त कार्यक्रम बजेट

सि.नं.	कृयाकलाप बिबरण	इकाई	परिमाण	भार	बजेट (लाखमा)
क)	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:				
१	खहरेखोला दामोदर रोडदेखि रतनपुर गल्लीसम्म तटवन्धा गढवा न.पा. दाड.	पटक	१	२३३९	४०
२	राप्ती नदीको मुहान नौबाहिनी जलाधार संरक्षण (भू क्षय गल्छि, पहिरो नियन्त्रण) नौबाहिनी गा.पा.प्युठान(नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	पटक	१	१४६२	२५
३	तिलधारा मुनि रोकदेरा पहिरो नियन्त्रण, परिवर्तन गा.पा. २ पाछावांग रोल्पा (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	पटक	१	८१७	१५
४	गल्छि पहिरो नियन्त्रण भू संरक्षण/वायोइन्जि. रुकुम पूर्व (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि काम)	पटक	१	३५१०९	६०
५	सिमसार व्यवस्थापन तथा संरक्षण	पटक	१	१३४५	२३
क	पूजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९५१३	१६३
ख	चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु				
१	फलफुल विरुवा उत्पादन तथा रोपण	क्षेत्र/जिल्ला	१	४१७	८
	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१	४१७	८
ग	कुल जम्मा (क+ख)			१००१०	१७१

# तेश्रो चौमासिक लक्ष्य प्रगति

(रकम रु लाखमा)

सि.नं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रम	बजेट	भारित प्रगति	खर्च	भारित प्रगति प्रतिशत	समग्र वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३३ चालु	तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन	३२१९		२१२४		५३६४%
२	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३४ पूँजिगत	फर्निचर, सवारी साधन, मेशिन औजार खरीद, मर्मत	०१२५		२१५		
३	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५३ चालु	गोष्ठी, Activity profile, प्रचार प्रसार	४१५	०१४३	४१५४	१००।०८%	
४	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५४ पूँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम(प्रदेश सरकार)	४४२	२०१५७	२१७९	४९।२९%	
५	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०३ चालु	फलफूल रोपण (संघिय सशर्त)	४	१।३३	५।७३	५६।८३%	
६	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०४ पूँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन (संघिय सशर्त)	६६	२७।७९	४७।५३	७२।०१%	
	जम्मा		५४९१		२९५१९	५२।७२%	

# बार्षिक लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था (रकम रु लाखमा)

सि.नं.	बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रम	बजेट	भार (कार्यक्रम बजेटको)	खर्च	भारित प्रगति	वित्तिय प्रगति
१	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३३ चालु	तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन	१०४१०७		७३२४		७०।३७%
२	ब.उ.शि.नं.३०७०२०१३४ पूँजिगत	फर्निचर, सवारी साधन, मेशिन औजार खरीद, मर्मत	५१५		५१४७		९९।४५%
३	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५३ चालु (कार्यक्रम)	गोष्ठी, प्रचार प्रसार, Activity profile तयारी	७५	०।७१	५३४	७१।२%	७१।२%
४	ब.उ.शि.नं.३०७०००१५४ पूँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम(प्रदेश सरकार)	१०५२	९९।२९	१०४४	९९।२३%	९९।२३%
५	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०३ चालु (कार्यक्रम)	फलफूल रोपण (संघिय सशर्त)	८	४।७	८	१००%	१००%
६	ब.उ.शि.नं.३०७००१२०४ पूँजिगत	जलाधार व्यवस्थापन ( संघिय सशर्त)	१६३	९५।३	१६३	१००%	१००%
	जम्मा		१३४०।० ७		१२९९।० ५	९९।७७%	९६।९३%

# कार्यक्रम तर्फको जिल्लागत योजना संख्या र प्रगति

(प्रदेश र संघिय सशर्त कार्यक्रम)

(रकम रु लाखमा)

क्र.सं	जिल्ला	जम्मा बजेट (रु लाखमा)	प्रगतिको अवस्था					कैफियत
			जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न नभएका संख्या	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१.	दाङ.	३३१।२	४२	४२		३३१।२	१००%	
२	प्यूठान	१७५	२१	२१		१७५	१००%	
३	रोल्पा	१७६।८	२२	२२		१५६।८	१००%	
४	रुकुम पुर्व	१४२।५	१८	१८		१४२।५	१००%	
५	बाके	१६५	१५	१५		१६५	१००%	
६	बर्दिया	१५५	१४	१४		१५५	१००%	
सिमसार व्यवस्थापन		२३	५	५		२३	१००%	
प्रचार प्रसार, प्राथमिकिकरण, उपजलाधार योजना, Activity profile तयार		२२।५	६	५	१	१२।३६	५४।९३%	
		जम्मा	१४३	१४२	१			
फलफूल घास डालेघास रोपण		३९।५	६९ समूह	६९ समूह		३९।४८	९९।९%	
कूल जम्मा		१२३०।५				१२२०।३४	९९।१७%	

# कार्यक्रम अनुसार भएका कार्य विवरण (प्रदेश सरकार तर्फ)

सि.नं	कार्यक्रमको नाम	बजेट (रु लाखमा)	खर्च	क्याकलाप सारांश
१	आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण तथा नदी खोला किनारा व्यवस्थापन	१२०	१२०	६ जिल्लाका १३ स्थानमा Check Dam, Retaining Wall, Breast Wall, Embankment, तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, प्युठान र रोल्पामा ४३० थान जाली वितरण
२	ग्रामिण सडकसंग भु संरक्षण कार्यक्रम	१०५	१०५	६ जिल्लाका १२ स्थानमा Check Dam, Retaining Wall, Breast Wall तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट सडक संरक्षण
३	नदी तथा खोला किनार व्यवस्थापन	३२३	३२३	६ जिल्लाका ३० स्थानमा Dike, Embankment, Revetment, Spur तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट पहिरो तथा नदी खोला कटान नियन्त्रण
४	संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	१८७५	१८७५	६ जिल्लाका २२ स्थानमा Check Dam, Retaining Wall, Breast Wall, Embankment तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट गल्छी, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण , २ गोटा पोखरी निर्माण
५	कृषि वन प्रणालीका लागि डालेघांस, फलफुलका विरुवा वितरण, रोपण	३१५	३१५	६ जिल्लाका ६१ समूहमा ६५३५० आंप, लिचि, कागती, एभोकाडोका बिरुवा वितरण ४ समूहमा ५०००० अमिसो वितरण, रोपण
६	पानी मुहान । संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम	५०	५०	६ जिल्लाका ९ स्थानमा पोखरी निर्माण तथा २ स्थानमा पानी श्रोत व्यवस्थापन एवं मूहान संरक्षण
७	गल्छी पहिरो तथा खहरे नि.	२२०	२२०	६ जिल्लाका २६ स्थानमा Check Dam, Retaining Wall, Breast Wall, Embankment, तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट गल्छि, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण
८	प्रचार प्रसार, प्राथमिकिकरण, उपजलाधार योजना. Activity profile तयार	२२१५	१२१३६	४ जिल्लाको उपजलाधार प्राथमिकिकरण, ब्रोसर, डायरी र

# कार्यक्रम अनुसार भएका कार्य विवरण (संघिय सशर्त अनदान तर्फ)

सि नं	कार्यक्रम	बजेट	खर्च	प्रगति सारांश	कैफि यत
१	खहरेखोला दामोदर रोडदेखि रतनपुर गल्लीसम्म <i>तटवन्ध गढवा न.पा. दाड.</i>	४०	४०	डाइक ,तारजालीको रिभेट्मेन्ट् र लन्चिङ सहितको तटवन्ध निर्माण	
२	राप्ती नदीको मुहान <i>नौबाहिनी जलाधार संरक्षण</i> (भू क्षय गल्छि, पहिरो नियन्त्रण) नौबाहिनी गा.पा.प्युठान (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	२५	२५	नौबाहिनी जलाधारको १ स्थानमा support Wall तथा २ स्थानमा Embankmen निर्माण गरि पहिरो नियन्त्रण र खोला किनारा संरक्षण	
३	तिलधारा मुनि <i>रोकदेरा पहिरो नियन्त्रण</i> , परिवर्तन गा.पा. २ <i>पाछावांग रोल्पा</i> (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	१५	१५	चेकडयाम, अम्रिसो र निगालो रोपण गरि पहिरो नियन्त्रण	
	<i>गल्छि पहिरो नियन्त्रण भू संरक्षण</i> वायोइन्जि. <i>रुकुम पूर्व</i> (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि काम)	६०	६०	रुकुम पुर्व जिल्लाको ७ स्थानमा Check Dam, Retaining Wall, Breast Wall, Embankment, तथा बिरुवा रोपण कार्यबाट पहिरो , गल्छी तथा नदी खोला किनारा संरक्षण	
५	<i>सिमसार व्यवस्थापन तथा संरक्षण</i>	२३	२३	२ गोटा पानी मूहान र ३ गोटा पोखरी निर्माण	
६	<i>फलफूल वितरण</i>	८	८	रोल्पा र रुकूमका ५वटा समुहमा ६००० स्याउको बिरुवा वितरण, बाके वर्दियामा २८०० आप लिचिका बिरुवा वितरण	

## उपलब्धिहरु

- नदी /खोला किनारा संरक्षण का लागि तटबन्ध निर्माण: १।४कि.मी.
- पहिरो, गल्छी / खहरे नियन्त्रण, ग्रामिण सडक संरक्षणका लागि टेवा पर्खाल निर्माण: ६।८ कि.मी.
- गल्छी / खहरे नियन्त्रणका लागि चेकड्याम निर्माण: २५ गोटा
- नदी /खोला किनारा संरक्षण का लागि स्पर निर्माण: १ गोटा
- संरक्षण पोखरी निर्माण: १५ गोटा
- इन्टेक, ट्यांकी निर्माण गरि पानी मुहान संरक्षण: ७ गोटा
- विरुवा उत्पादन: २०००० गोटा
- उपजलाधार प्राथमिकिकरण : ४ जिल्ला

## उपलब्धिहरु

- फलफूलका विरुवा वितरण र रोपण: ७४२०० गोटा
  - आंप:८७०० लिचि: ७५०० अनार: ३८२० कागति:४८०००
  - एभोकार्डो :२०० अम्बा: १८० स्याउ: ६०००
- अमृसो रोपण: ७०००० सेट
- प्रत्यक्ष संरक्षित क्षेत्रफल: ५५० हे.
- सिंचित क्षेत्रफल: ९ हे.
- रोजगारी श्रमदिन: ७५६३०
- लाभान्वित घरधुरी: १०५००

# प्रशासनिक (उपभोग र संचालन) तथा कार्यक्रम बजेट र खर्चको अवस्था

(रकम रु लाखमा)

सि. नं	विवरण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	तलव भत्ता, कार्यालय संचालन तर्फ (चालु पूजिगत)	१०९।५७	७८।७२	६१.०६%
२	कार्यक्रम तर्फ (चालु पूजिगत)	१२३.०५	१२२.०१३३	९९.१४%
३	जम्मा	१३४.०१०७	१२९.९१०५	

## विविध :

- ६ जिल्लाका कुल ४९ स्थानीय तहहरूमध्ये ३१ स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रम संचालन भएको
- कार्यक्रमको धेरै मागका कारण बार्षिक कार्यक्रममा लक्ष्य तोकिएकामा भन्दा बढी स्थानमा कार्यक्रम संचालन गरिएको
- रु ७० लाख साभेदार निकाय (स्थानीय तहहरू) बाट लगानी भएको
- प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, ग्रामिण सडक संरक्षण, पानी श्रोत व्यवस्थापन जस्ता संरक्षणका कामबाट प्रत्यक्ष संरक्षित क्षेत्र र प्रत्यक्ष लाभान्वित घरधुरी भन्दा अप्रत्यक्ष क्षेत्र संरक्षण र घरधुरी लाभान्वित धेरै बढी हुन जाने ।

# बेरुजु को अवस्था

- प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको बेरुजु रु ७ लाख ६ हजार ( आ.व.०७६।०७७मा Contingency ५ प्रतिशत राखिएको तर ४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाको आधिकारिक पत्र कार्यक्रम सकिने क्रममा मात्र प्राप्त हुन आएकाले )
- साविकको कार्यालयको बेरुजु रु १२ लाख ४४ हजार
- बेरुजु फछ्छ्यौटका लागि प्रमाण सहितका कागजात राखि पत्राचार भएको ।

## कार्यक्रम । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू :

- सिमित जनशक्तिले ६ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या
- प्राथमिकता प्राप्त जलाधार क्षेत्रहरूमा एकिकृत रूपमा नगरि जिल्लाभरि छरेर काम गर्नुपर्दा परिणाम देखाउन र माग सम्बोधन गर्न कठिनाई
- 

## समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू :

- स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र जनप्रतिनिधिहरू संगको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरिएको
- दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरिएको
- सबै जिल्लाको जलाधार प्राथमिकिकरणको कार्य गरिएको, प्राथमिकता प्राप्त जलाधारको जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार र ति जलाधारमा एकिकृत रूपमा कार्यक्रम गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ।
-

कार्यक्रमका केहि फोटोहरु







गलछी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
राप्तीसोनारी गा.पा. १, बसेरी, बाँके





गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
राप्तीसोनारी गा.पा. १, बुकाखोला, बाँके

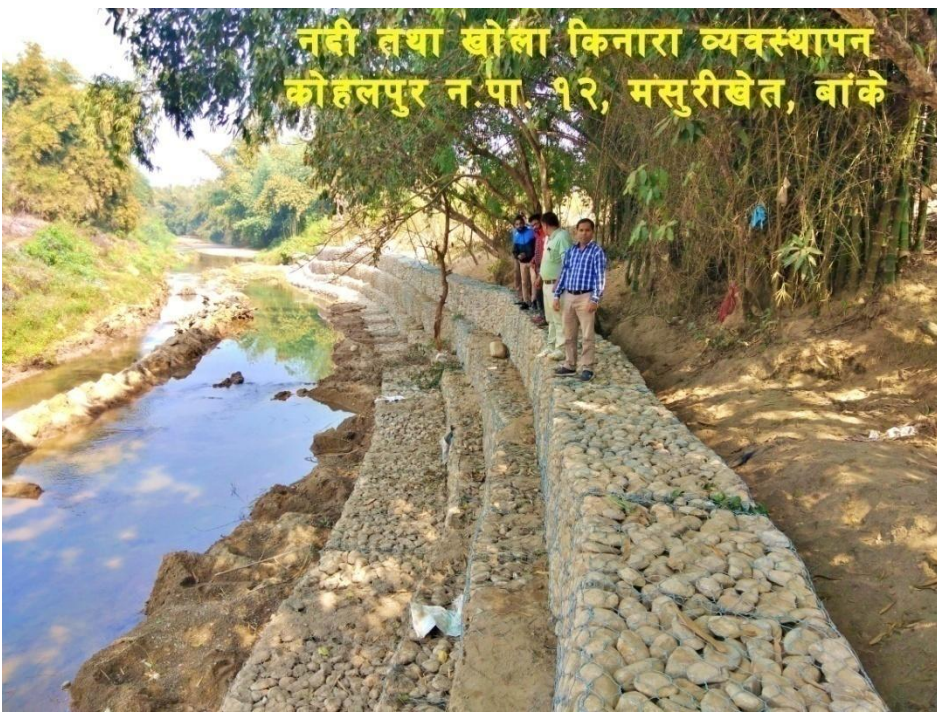

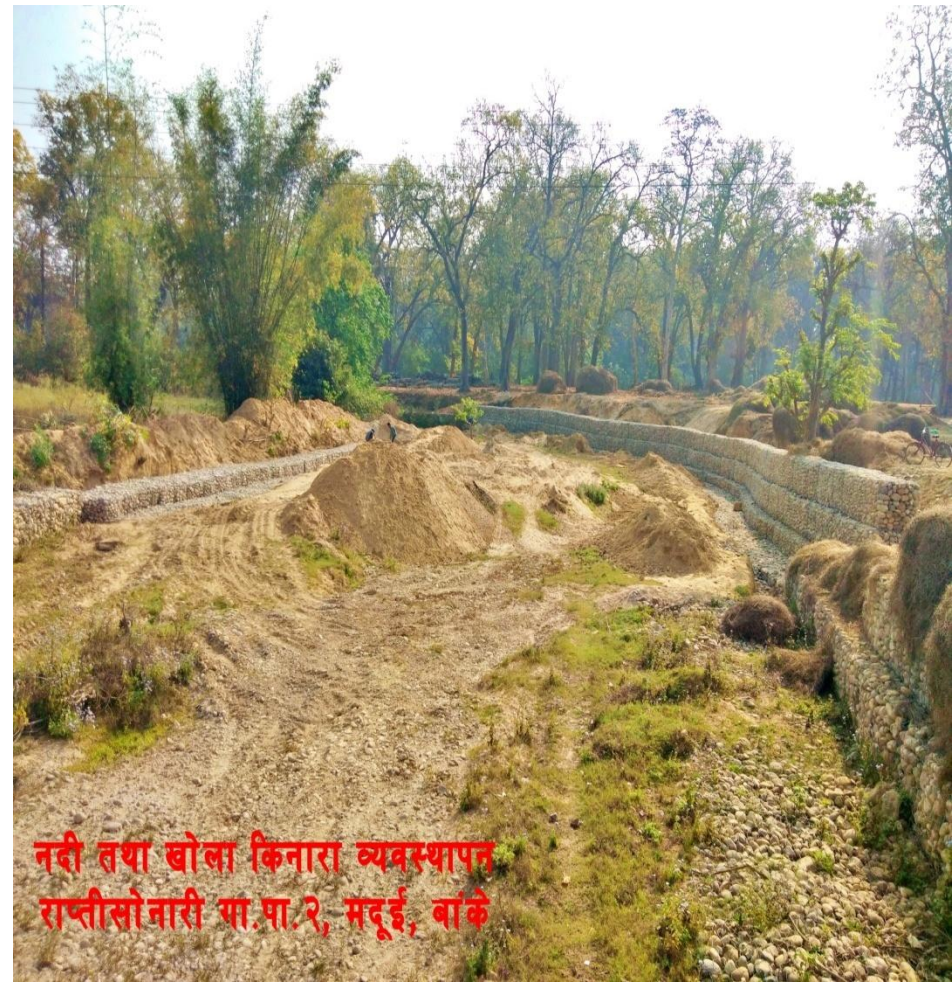

नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन  
राष्ट्रीसोनारी गा.पा.२, मर्दूई, बाँके



आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण तथा नदी खोला किनारा व्यवस्थापन  
राप्तीसोनारी गा.पा. १, सौंसीघोला, बाँके



**पानी मुहान संरक्षण । पोखरी निर्माण  
कोहलपुर न.पा. ११, थारुगांउ, बांके**





गामिण सडकसंग भू-संरक्षण कार्य  
ठाकुरबाबा न.पा. ९, वनतरिया, बर्दिया





नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन  
ठाकुरबाबा न.पा. ६, खोकरपुर, बर्दिया






**संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
बांसगढी न.पा. २, रेहुखोला, बर्दिया**






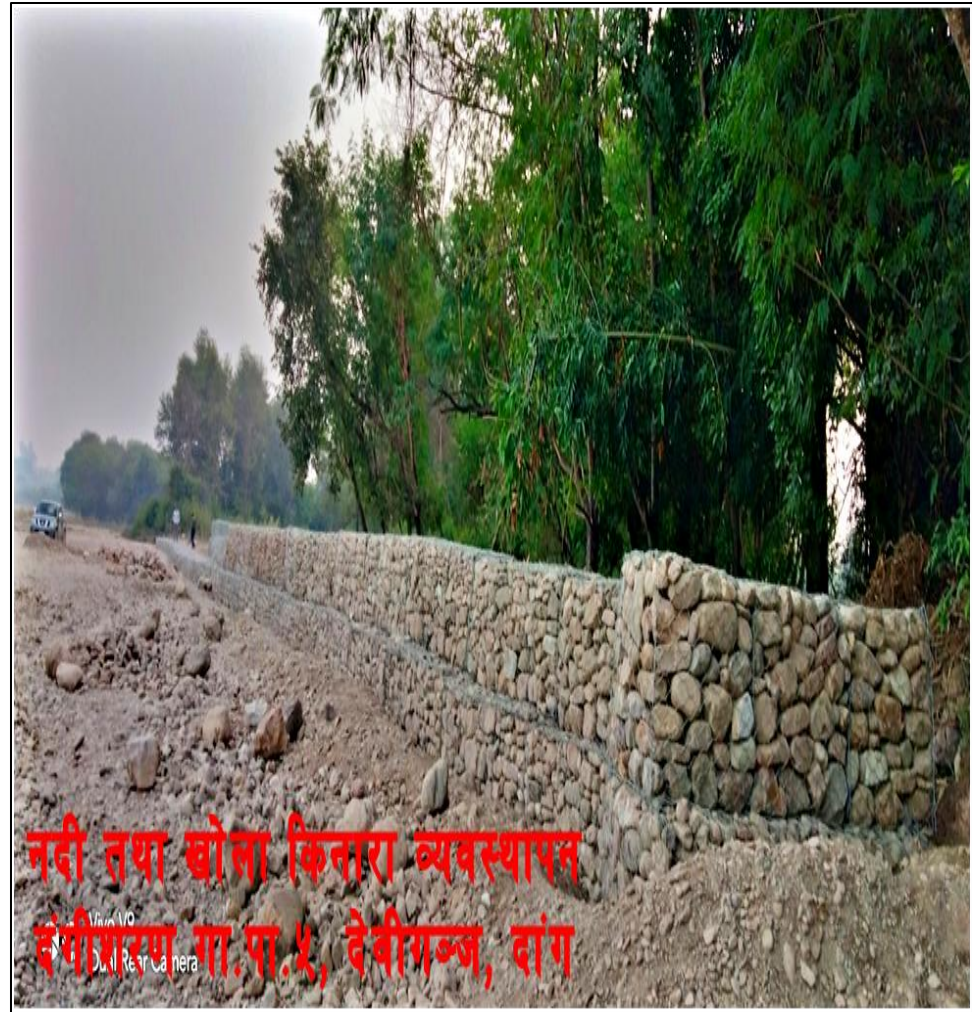



पानी मुहान संरक्षण  
बबई गा.पा.४, टवांग खोला, दांग

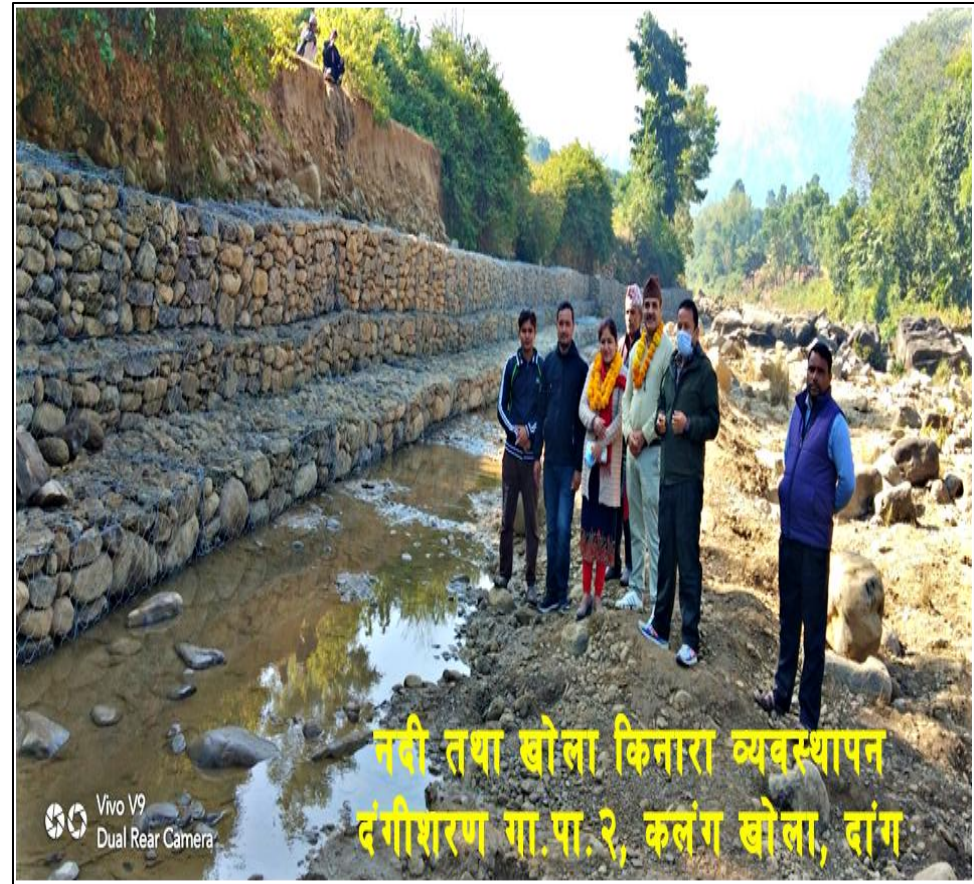


नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन  
दंगीशरण गा.पा.२, कलंग खोला, दांग



संरक्षित जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
ठाकुरबाबा न.पा. ४, सैनवार, बर्दिया




Vivo V9  
Dual Rear Camera

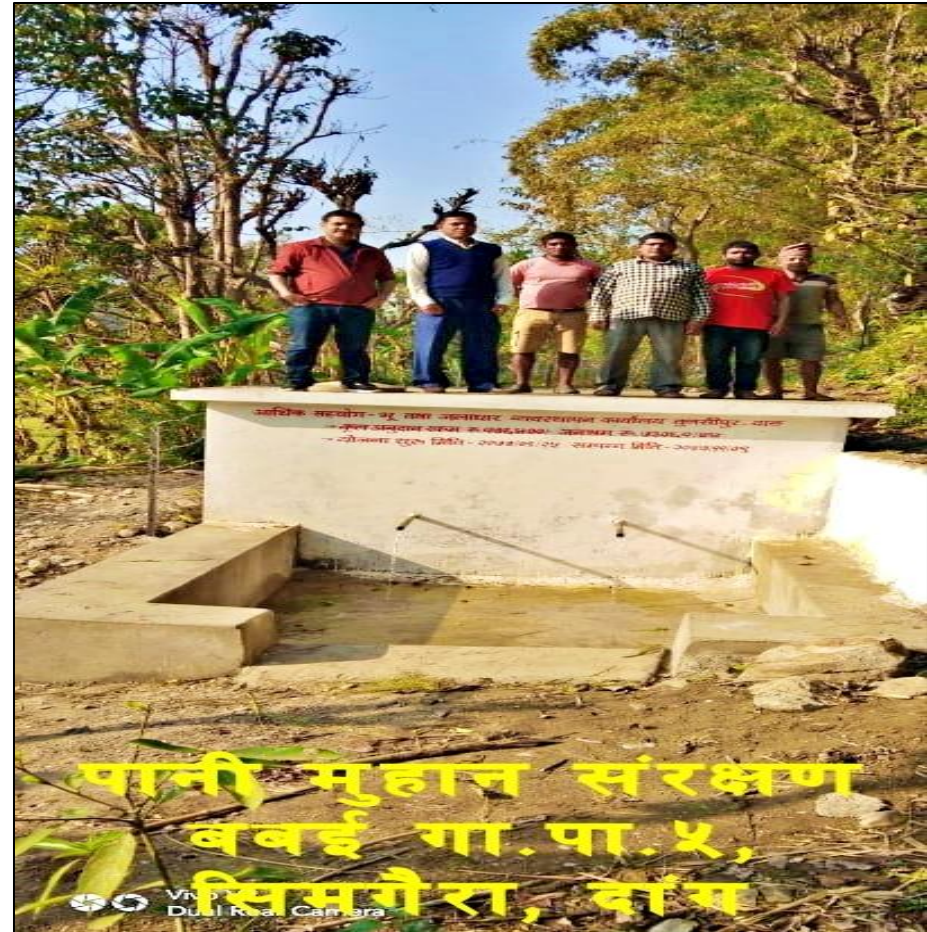

आर्थिक सहायता - ५५ लाख अनासुरार सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण - सारव  
- सुवा सारवसुवायुण सारव सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण  
- सारवसुवायुण सारव सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण सारवसुवायुण

पानी मुहान संरक्षण  
बबई गा.पा.५,  
धिमगौरा, दांग


Vivo V9  
Dual Rear Camera

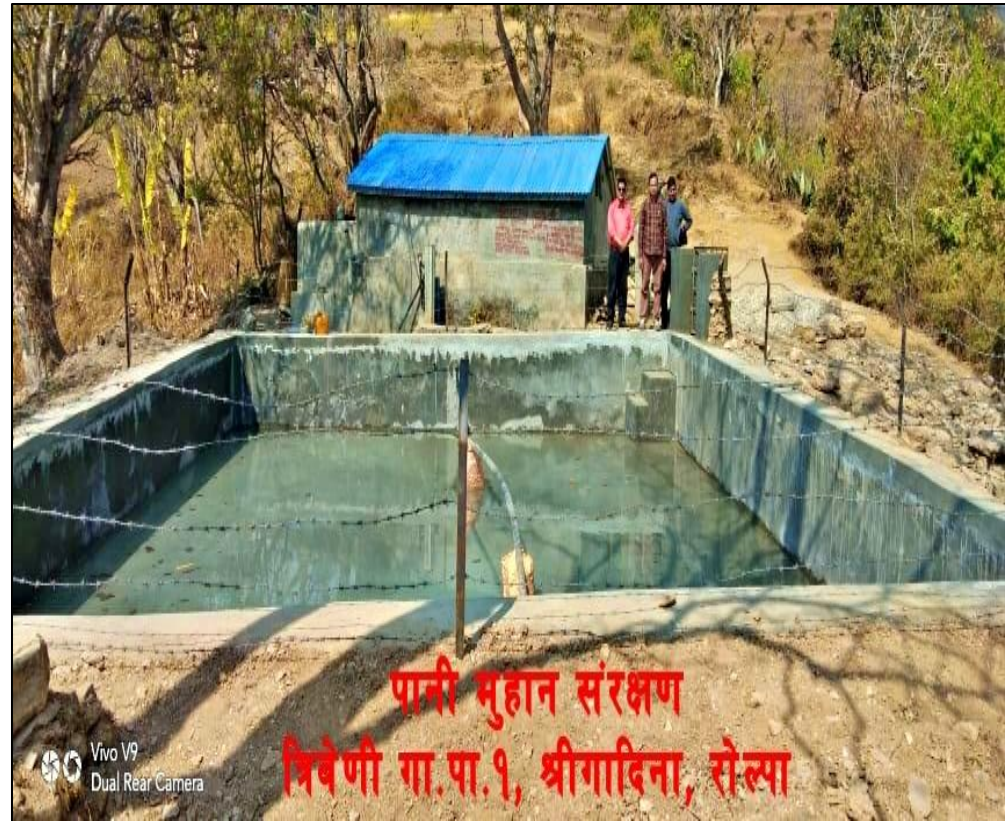

पानी मुहान संरक्षण  
त्रिवेणी गा.पा.१, श्रीगादिना, सोल्या



पोखरी तथा तालतलैया संरक्षण  
लमही न.पा.६, देउपुर, दांग

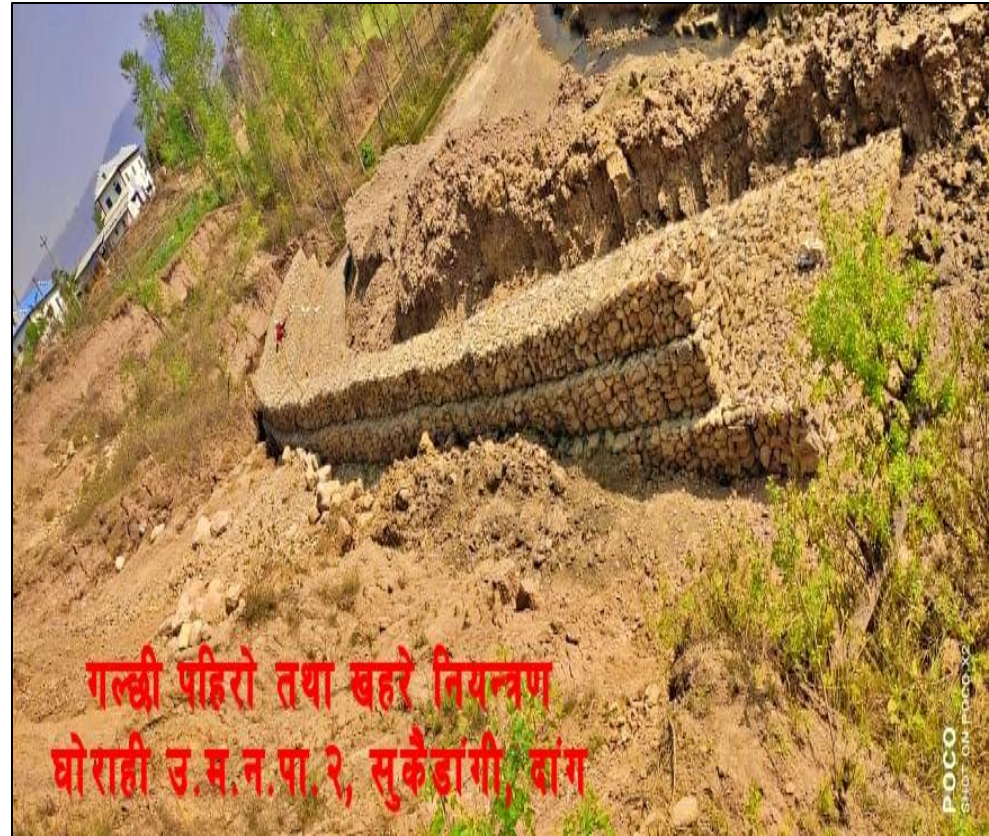


गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
घोराही उ.म.न.पा.२, सुकैडांगी, बाग





Vivo V9  
Dual Rear Camera

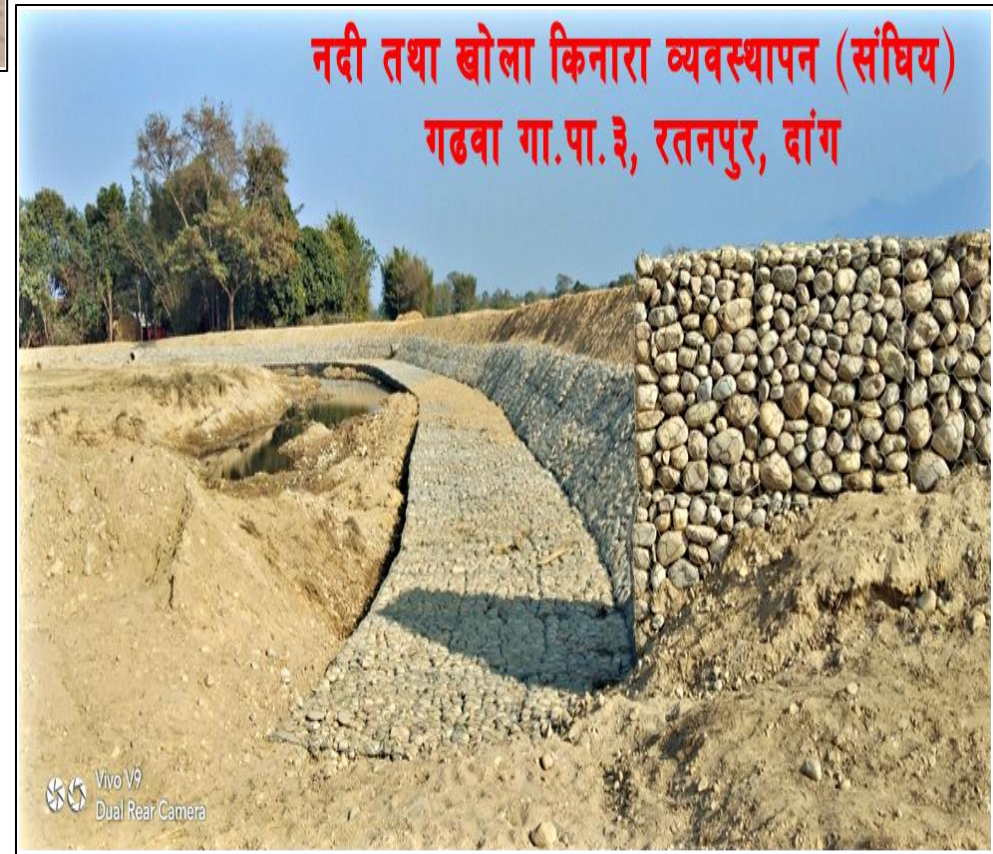



नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन (संघिय)  
गढवा गा.पा.३, रतनपुर, दांग

Vivo V9  
Dual Rear Camera




ग्रामिण सडकसंग भू संरक्षण कार्य  
शान्तिनगर गा.पा.३, स्वामीगैरा, दांग

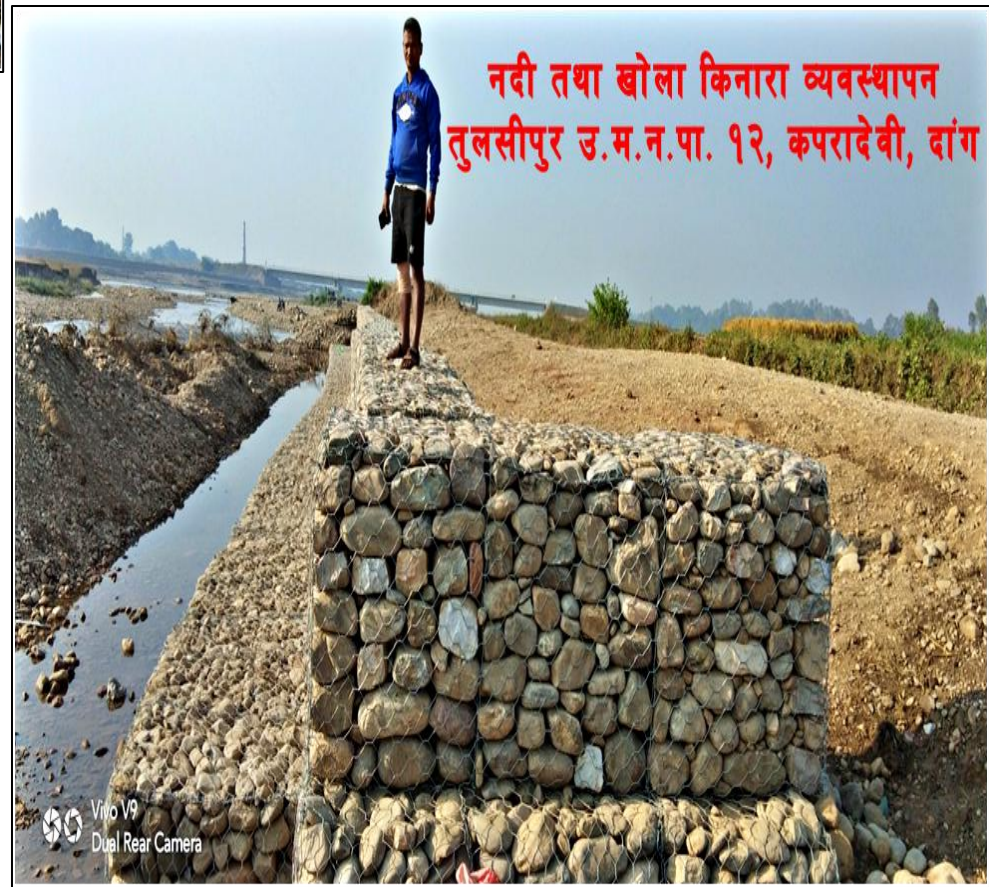

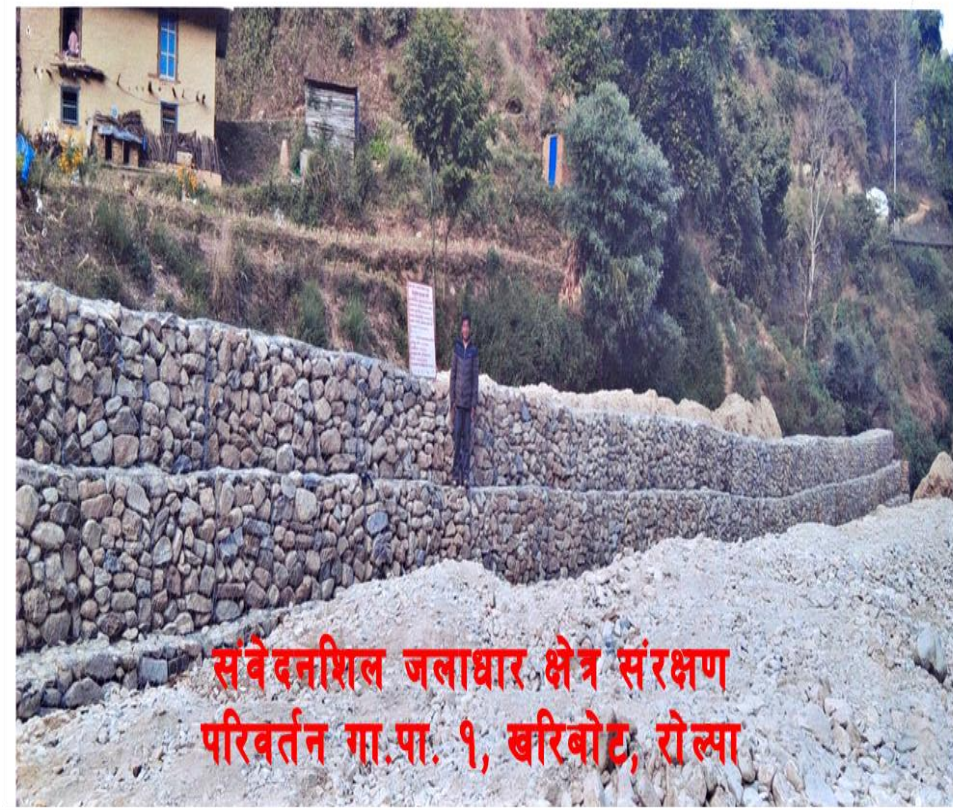

संवेदनशील जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
परिवर्तन गा.पा. १, खरिबोट, रोल्पा

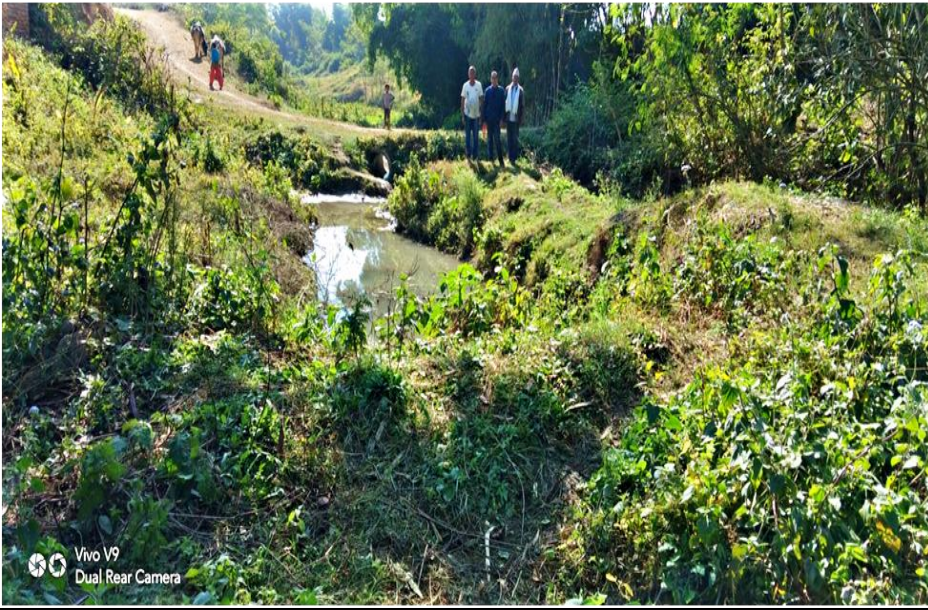




Vivo V9  
Dual Real Camera



कृषिवन प्रणालीका लागि फलफूलका विरुवा वितरण  
रोल्पा

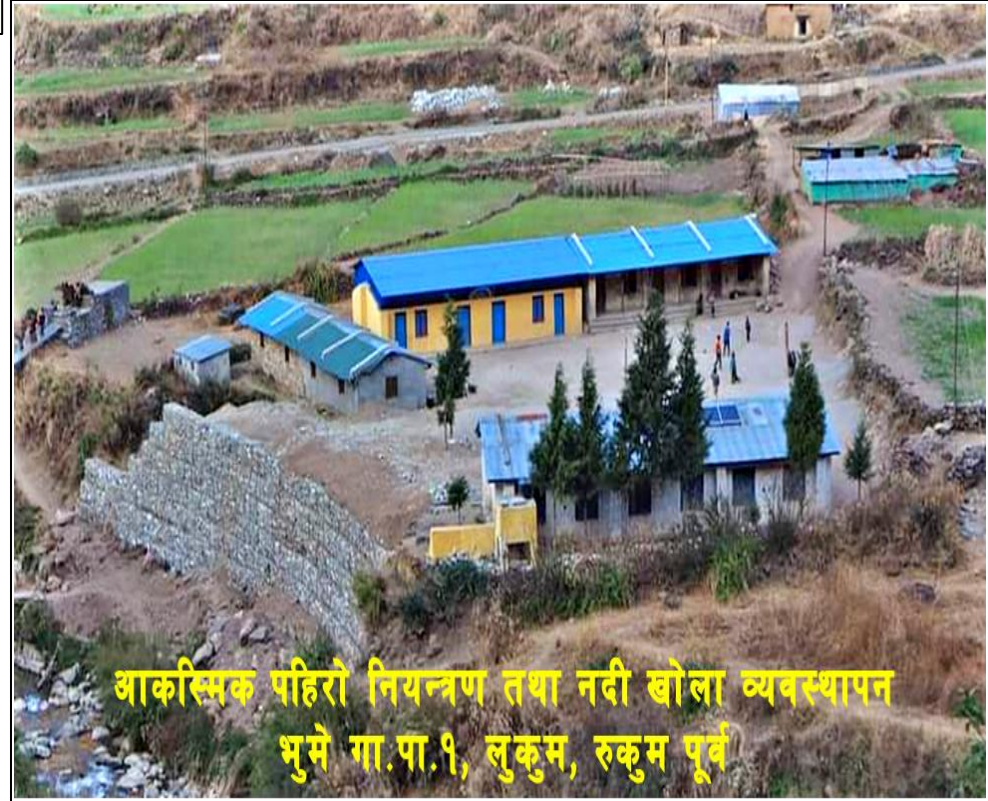


आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण तथा नदी खोला व्यवस्थापन  
भुमे गा.पा.१, लुकुम, रुकुम पूर्व






गलछी, पहिरो नियन्त्रण (संघिय)  
सिस्ने गा.पा.८, लौमुल

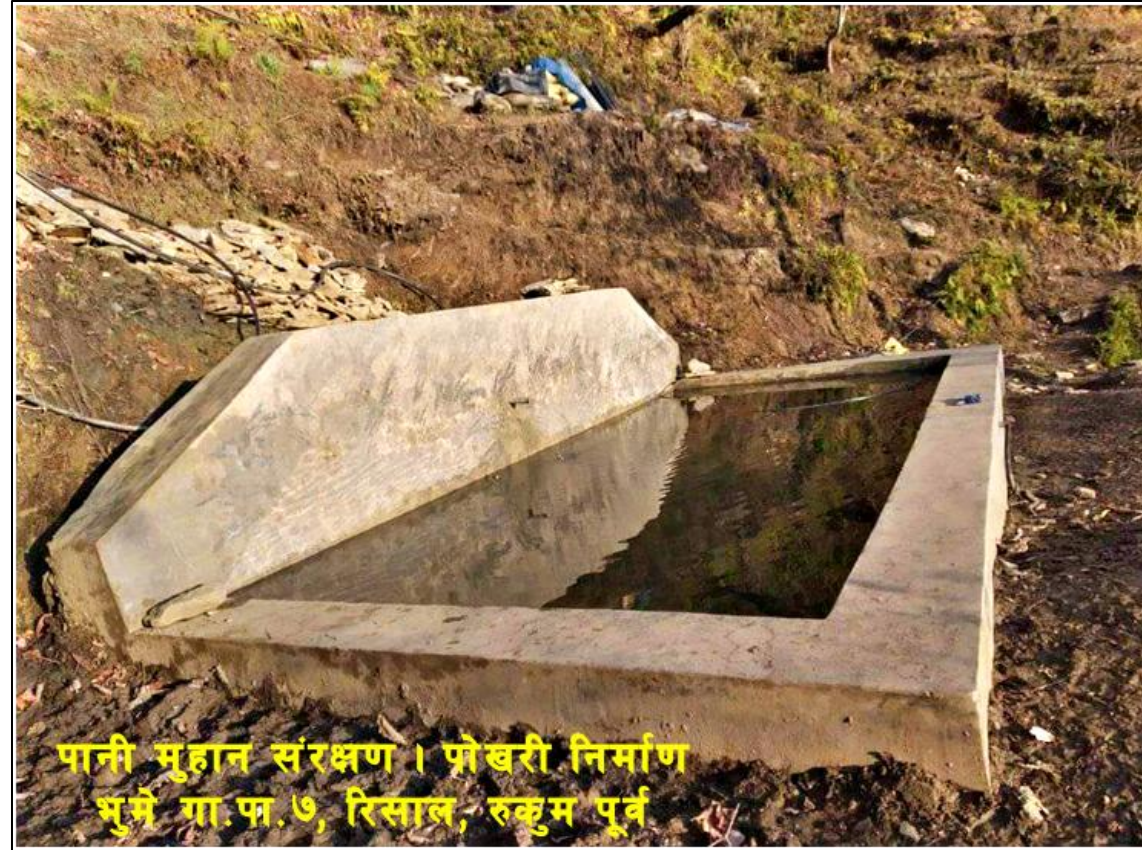

पानी मुहान संरक्षण । पोखरी निर्माण  
भुमै गा.पा.७, रिसाल, रुकुम पूर्व



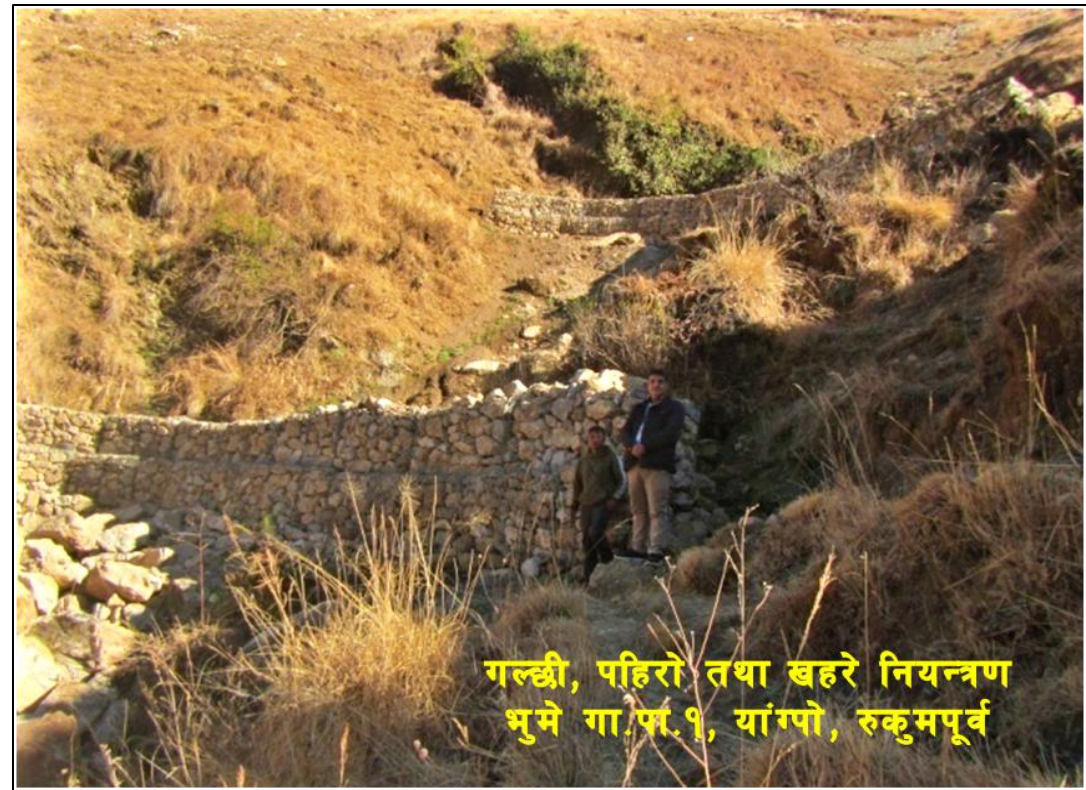

गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
भुमे गा.पा.१, यांग्पो, रुकुमपूर्व








ग्रामिण सडकसंग भू संरक्षण कार्य,  
सरुमारानी त.पा. ४, बडडांडा, प्युठान




गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
माण्डवी गा.पा.५, भिमुक, प्युठान




नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन  
स्वर्गद्वारी न.पा.५, खोलाखेत, प्युठान

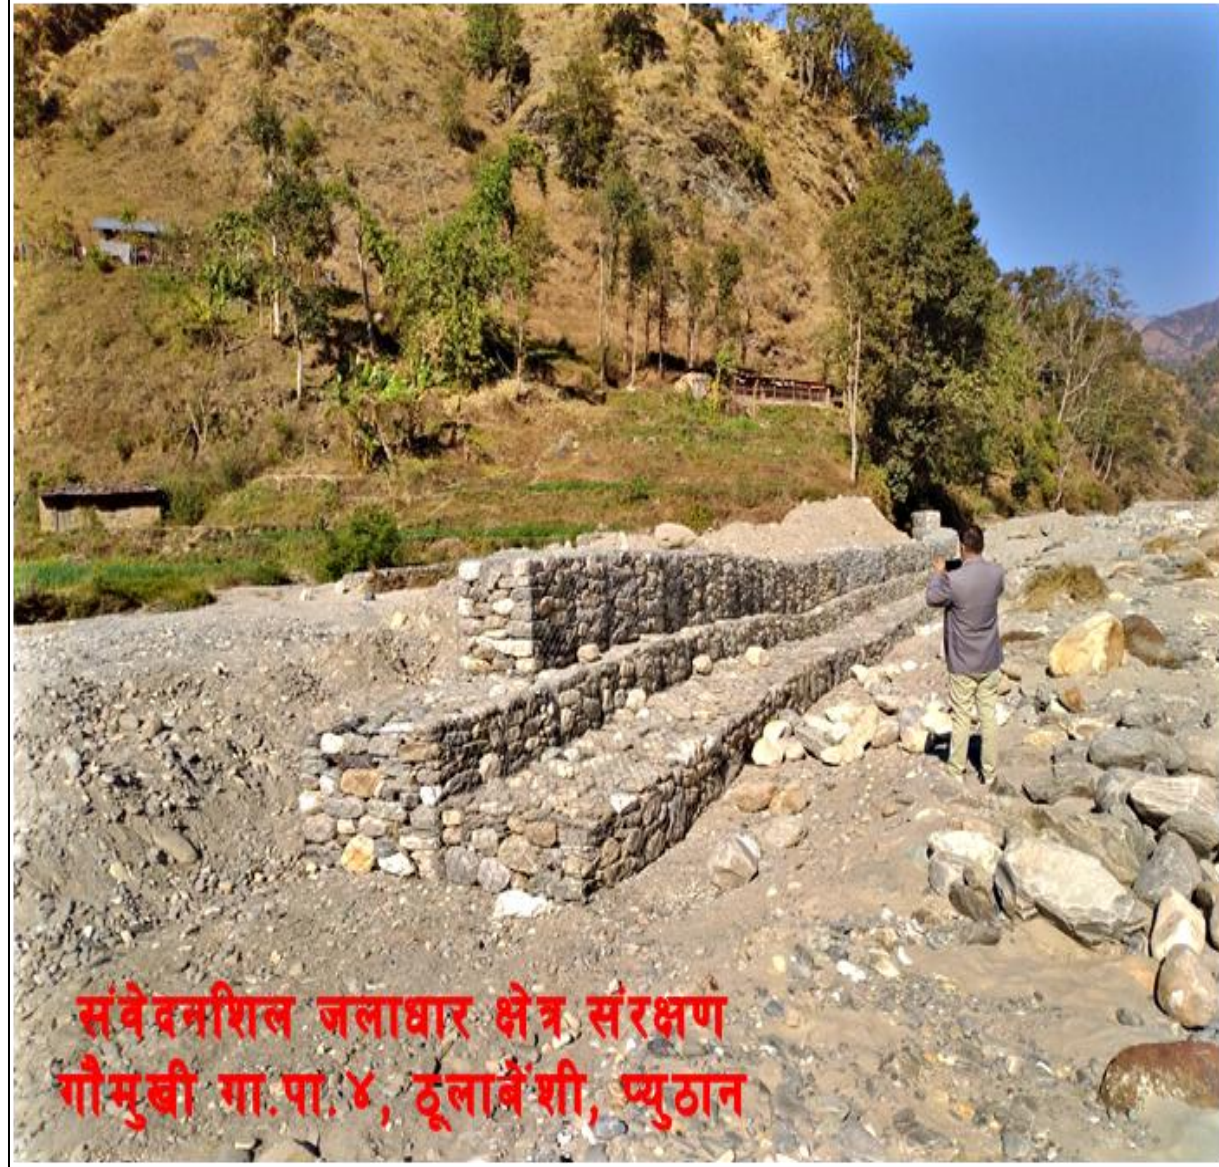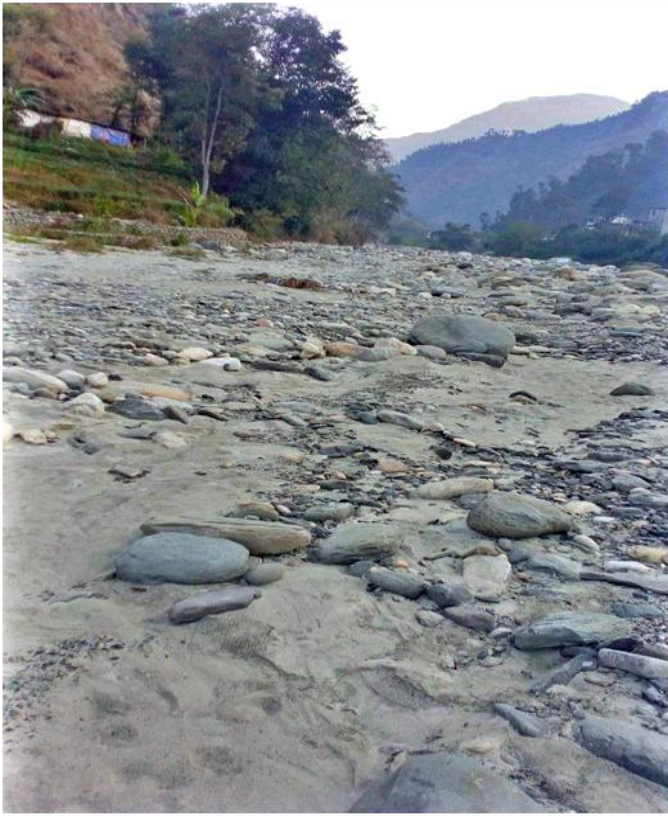


संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
गौमुखी मा.पा. ४, ठूलाबेंशी, प्युठान

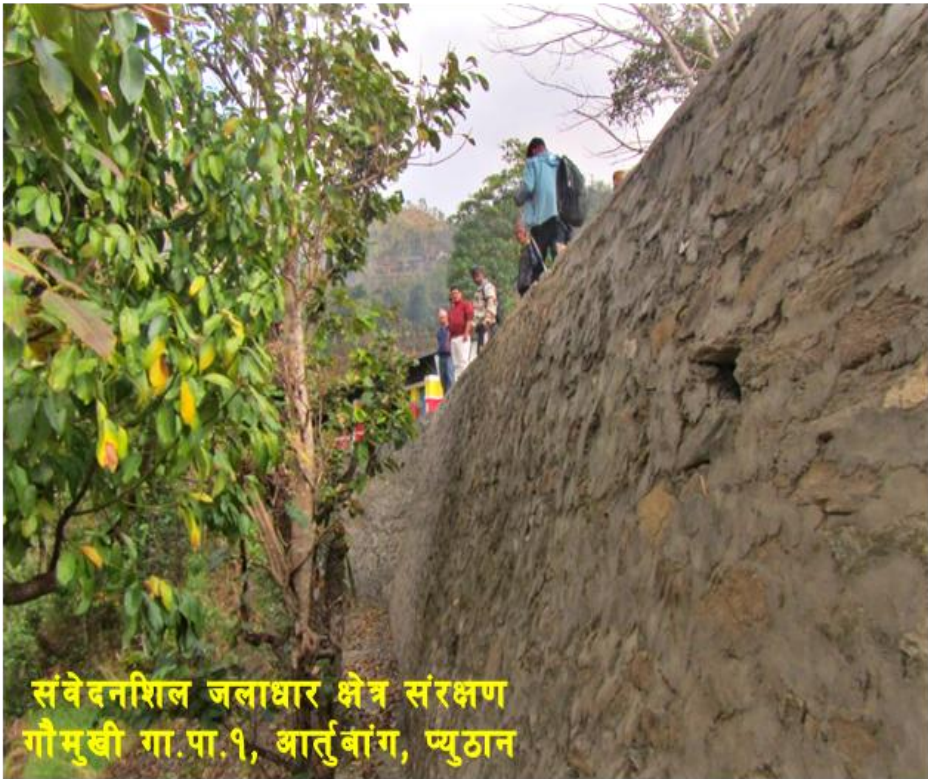

संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
गौमुखी गा.पा.१, आर्तुबांग, प्युठान

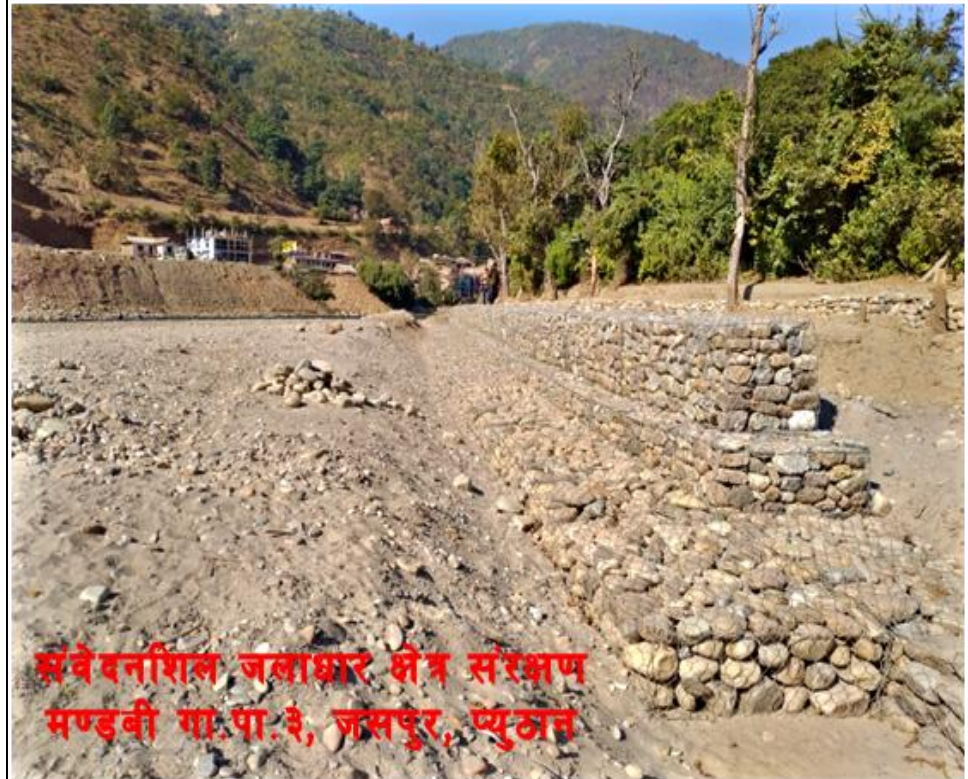

संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
मण्डवी गा.पा.३, जसपुर, प्युठान

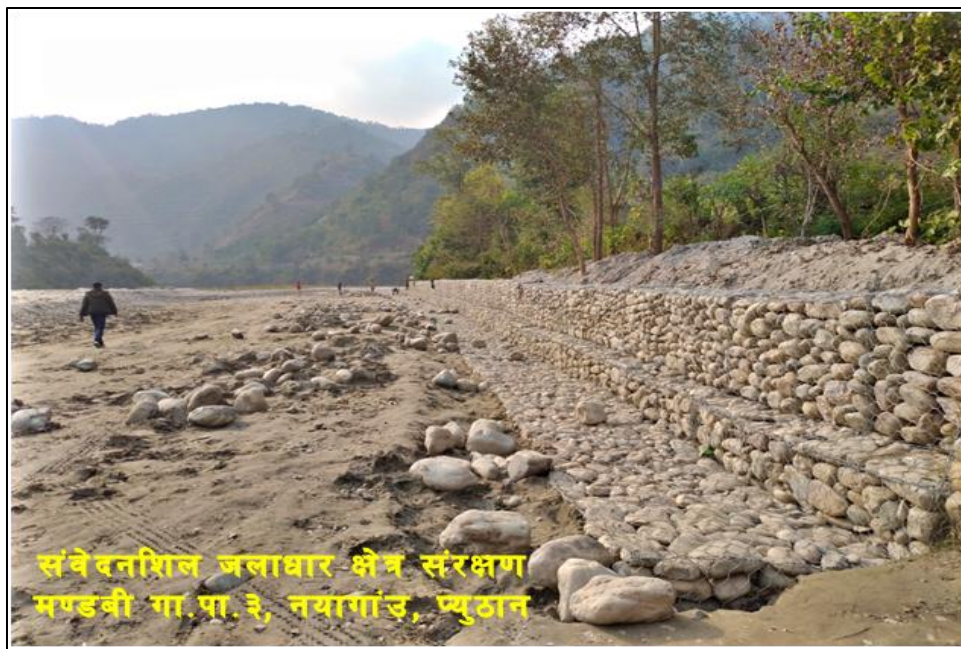

संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
मण्डवी गा.पा.३, नयागाँउ, प्युठान



**संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण  
कोहलपुर न.पा. १२, जानकीनगर, बांके**






गलछी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण  
ठाकुरबाबा ँ, चिट्कैया, बर्दिवा

# अनूगमनका क्रममा लिएका तस्बिरहरु







A close-up photograph of a person's hand holding a small, vibrant green seedling with several leaves and a small amount of dark soil. The background is a bright blue sky with scattered white clouds. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting.

सुभाव, सल्लाह तथा जिज्ञासा को  
अपेक्षा गर्दछु ।

• **Thank you**
